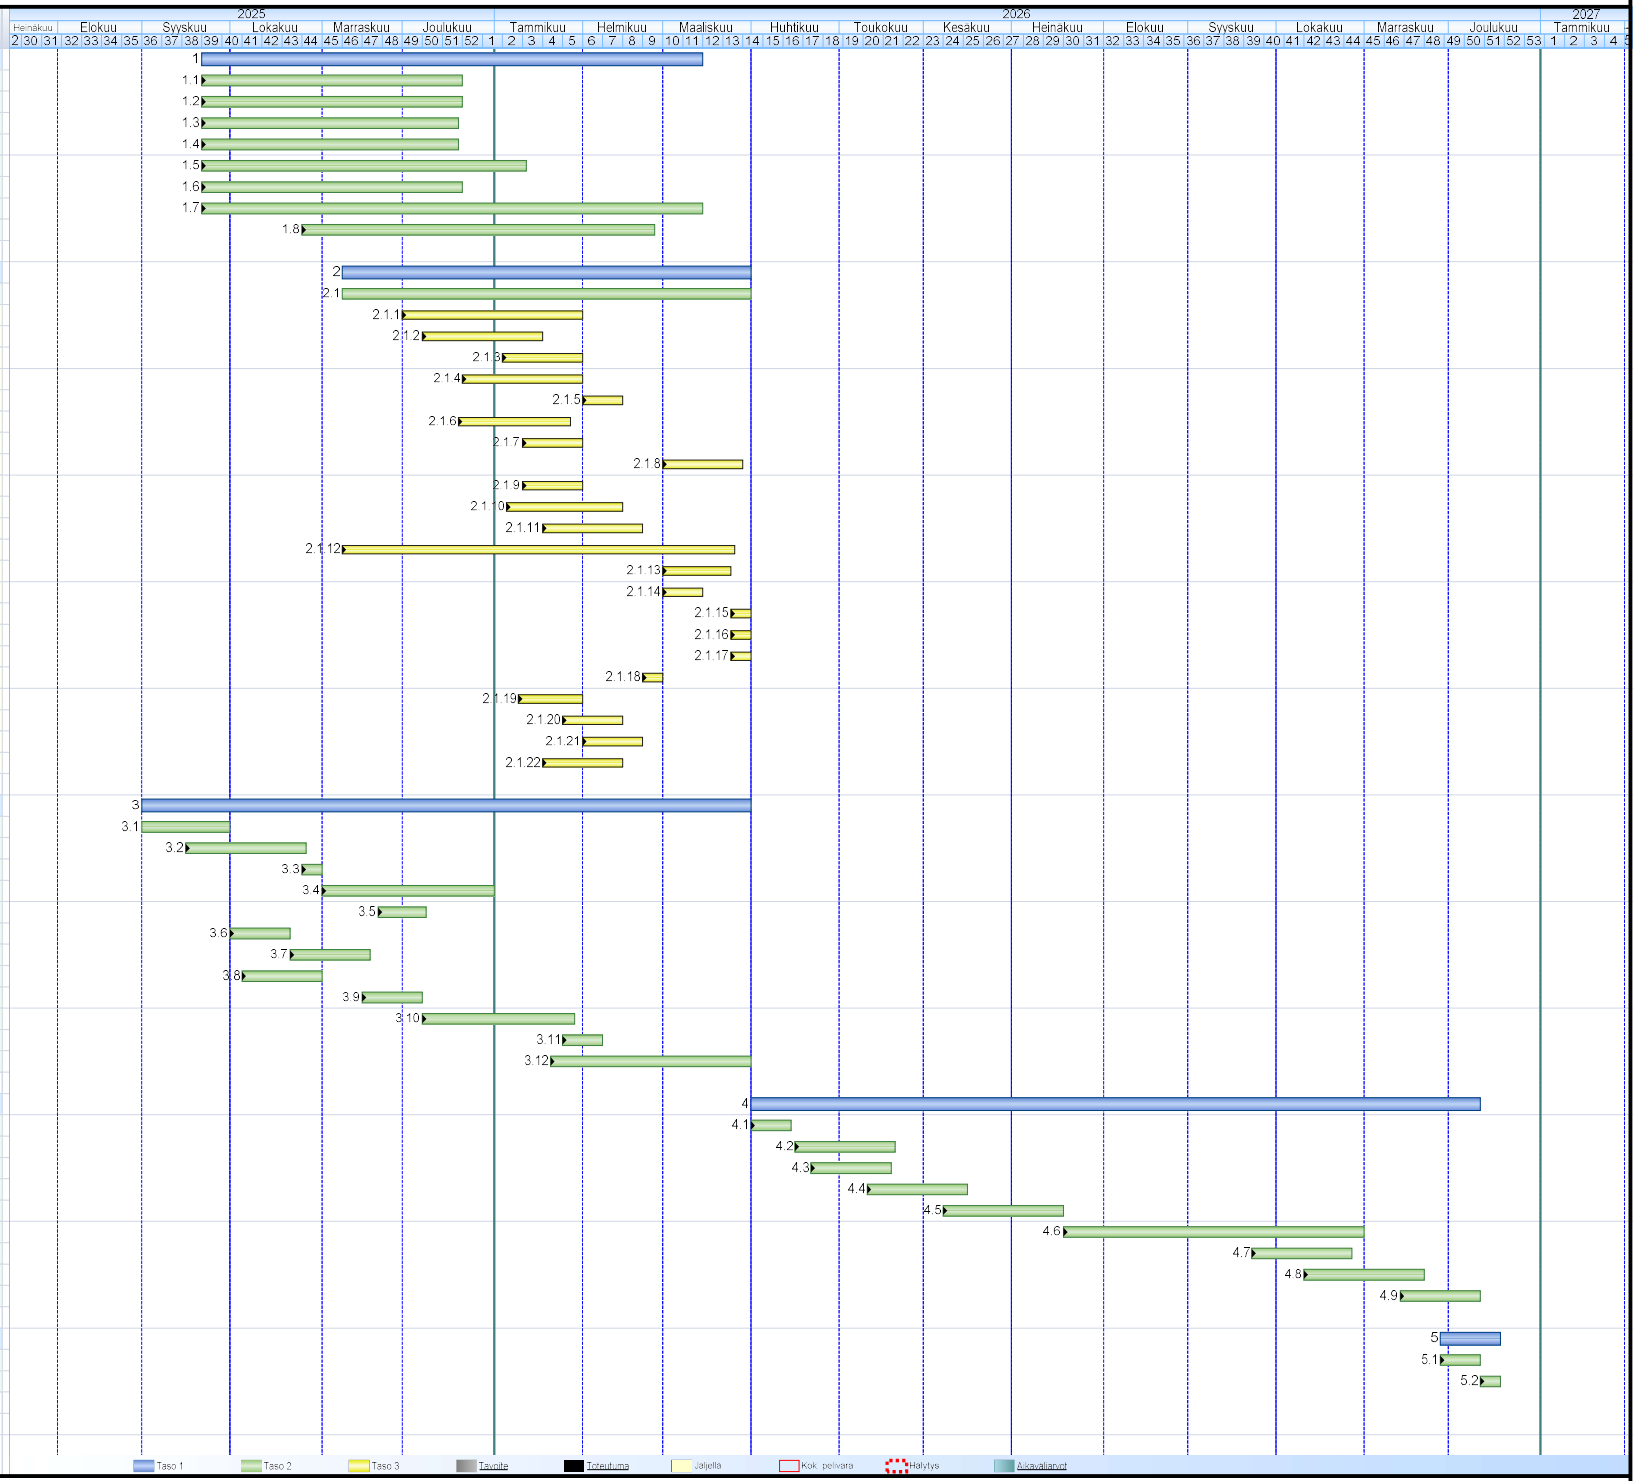	Hier	Nimi	Kesto	Aik. alku
1	-1	**Toiminta käynnissä ja alasajo**	122 pv	22.09.25
2	1.1	BV 107	65 pv	22.09.25
3	1.2	BV 118	65 pv	22.09.25
4	1.3	BV 108	64 pv	22.09.25
5	1.4	BV 109	64 pv	22.09.25
6	1.5	BV 119	78 pv	22.09.25
7	1.6	Kaasukenttä	65 pv	22.09.25
8	1.7	Kaukolämpökeskus	122 pv	22.09.25
9	1.8	Sprinklerikeskus ?	85 pv	27.10.25
11	-2	**Wärtsilä muutto ja purkuja**	99 pv	10.11.25
12	-2.1	BV107, BV118, BV108, BV109, BV119 ja kaasukenttä	99 pv	10.11.25
13	2.1.1	Muuntajat purku/myynti/poisvienti (1 kpl jää)	42 pv	01.12.25
14	2.1.2	Kaasusäiliöiden tyhjennys	27 pv	08.12.25
15	2.1.3	Siltanosturipurkuja	20 pv	05.01.26
16	2.1.4	Metanolirunkolinjan tyhjennys /laitteistopurku	27 pv	22.12.25
17	2.1.5	Kemikaalikaappien tyhj.	10 pv	02.02.26
18	2.1.6	Tietoverkon ja UPS:en alasajo	25 pv	19.12.25
19	2.1.7	Automaatio muutokset ja alasajot (backup-virta?)	15 pv	12.01.26
20	2.1.8	Elisan maston purku	20 pv	02.03.26
21	2.1.9	ATEX-alueet kanavapuhdistukset	15 pv	12.01.26
22	2.1.10	Kaasuhälytyskeskuksen irtikytkennät	29 pv	06.01.26
23	2.1.11	Sprinkleri alasajo ???	25 pv	19.01.26
24	2.1.12	Raskasöljylinjojen ja tankkien pesu (HFO)	95 pv	10.11.25
25	2.1.13	Öljynerotuskaivojen ja putkistojen pesu	17 pv	02.03.26
26	2.1.14	Paineilmaverkoston alasajo	10 pv	02.03.26
27	2.1.15	Vesi irtikytkentä	5 pv	25.03.26
28	2.1.16	Sähkö irtikytkentä	5 pv	25.03.26
29	2.1.17	Kaukolämpöirtikytkentä	5 pv	25.03.26
30	2.1.18	Palohälytysjärjestelmän irtikytkentä	5 pv	23.02.26
31	2.1.19	Teräsosien ja -rakenteiden purku	16 pv	09.01.26
32	2.1.20	Kalusteiden ja varusteiden purku/luovutus	15 pv	26.01.26
33	2.1.21	Mahd. IV-koneet talteen?	15 pv	02.02.26
34	2.1.22	Hissin purku	20 pv	19.01.26
36	-3	**Purkutöiden valmistelu ja suunnittelu**	149 pv	01.09.25
37	3.1	Vanhat suunnitelmat koonti (pdf)	22 pv	01.09.25
38	3.2	Purkulupapiirustukset ja RAPU-selvitys	30 pv	16.09.25
39	3.3	Purkulupahakemuksen jättö	5 pv	27.10.25
40	3.4	Purkuluvan käsittely ja luvan liitteiden päivitykset	40 pv	03.11.25
41	3.5	Naapureiden kuuleminen	12 pv	21.11.25
42	3.6	Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen kilpailutus	15 pv	01.10.25
43	3.7	Asbesti- ja haitta-ainekartoitusten suorittaminen	20 pv	22.10.25
44	3.8	Purkuselvityksen laadinta	20 pv	06.10.25
45	3.9	Purku-urakan tarjouspyyntöasiakirjat	15 pv	17.11.25
46	3.10	Purku-urakan laskenta ja tarvittavat neuvottelut	35 pv	08.12.25
47	3.11	Purku-urakan urakkasopimus	10 pv	26.01.26
48	3.12	Ympäristölupa bet. murskaamiselle haku ja käsittely	50 pv	21.01.26
50	-4	**Purkutyöt**	182 pv	01.04.26
51	4.1	Purkualueen aitaaminen ja liikennejärjestelyt (vaihe-2)	10 pv	01.04.26
52	4.2	BV107 asbesti- ja sisäpurku	25 pv	16.04.26
53	4.3	Kaasukentän purku	20 pv	22.04.26
54	4.4	BV108, BV109 ja BV119 rakennuspurku	25 pv	12.05.26
55	4.5	BV107 pipun purku	30 pv	08.06.26
56	4.6	BV107 rakennuspurku	75 pv	20.07.26
57	4.7	Käyttöön jäävien rakennusosien viimmeistelyt	25 pv	23.09.26
58	4.8	Betonijätteen murskaus, mahd. varastointi / poiskulj.	30 pv	12.10.26
59	4.9	Maisemointi	20 pv	13.11.26
61	-5	**Purkutöiden vastaanotto**	15 pv	27.11.26
62	5.1	Vastaanottotarkastus koskien rakennuspurkuja	10 pv	27.11.26
63	5.2	Jälkitarkastus ja maisemoinnin hyväksyntä	5 pv	11.12.26
